

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
JANEIRO/2022

SUMÁRIO

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO	4
1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS	4
1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS	6
1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 4 OBRAS	7
1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS	8
1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS	13
1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA.....	15
1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS	16
1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS	17
2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR	19
3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)	21
4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	24
5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 16 AÇÕES	26
6. DESEMBOLSOS TOTAIS	28
6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)	29
7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS	30
7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES	31
7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO.....	32
7.3 MANUTENÇÃO GERADORES	33
7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL	34
7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER.....	38
7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	39
7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	43
7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED	44
8 ANEXO	45
8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS	45
8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS.....	46
8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS	48
8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS	48
8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS	50

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 23/02/2022.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de *% financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	Construção Bloco Criminal	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 62.624.349,34	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	27	
	Prazo decorrido de execução (meses)	23	
	% físico realizado	20,04%	
	Medição realizada	4ª / 20	
	Medição requerida	5ª	
	% financeiro realizado consolidado	27,33%	
	Saldo a pagar	R\$ 45.510.205,21	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		
	Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%		


2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.133.337,92	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	dezembro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	25	
	Prazo decorrido de execução (meses)	28	
	% físico realizado	54,47%	
	Medição realizada	10ª / 14	
	Medição requerida		
	% financeiro realizado consolidado	52,97%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.884.792,64	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 40.872.133,96	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	20	
	Prazo decorrido de execução (meses)	16	
	% físico realizado	14,85%	

Medição realizada	6ª / 18
Medição requerida	
% financeiro realizado consolidado	12,86%
Saldo a pagar	R\$ 35.616.644,66
% financeiro não consolidado (se houver)	
Termo de Recebimento	.
Inauguração/Ocupação	

4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.378.308,06	
Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
Emissão OES	novembro, 2021	
Data prevista conclusão	janeiro, 2023	
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	2	
% físico realizado	0,00%	
Medição realizada	0 / 13	
Medição requerida	1ª	
% financeiro realizado consolidado	0,00%	
Saldo a pagar	R\$ 9.378.308,06	
% financeiro não consolidado (se houver)	3,55%	
Termo de Recebimento	.	
Inauguração/Ocupação		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:

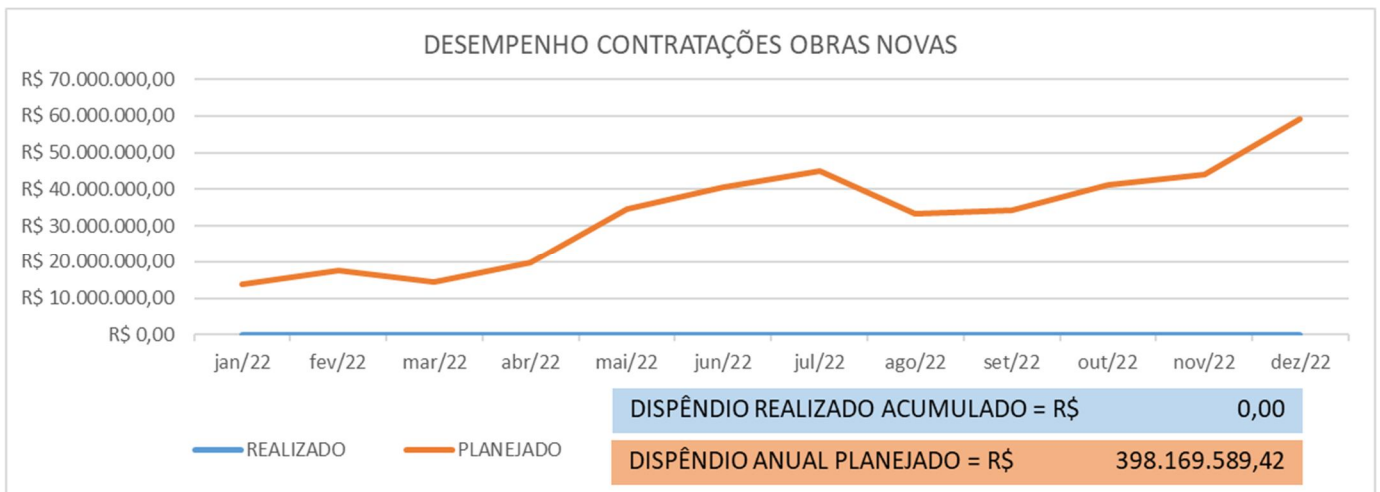

1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

1	BELA VISTA DO PARAÍSO	Construção Fórum Novo
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 8.156.223,56
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Março, 2020
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

2	CURITIBA - PRÉDIO ANEXO	Sonorização Plenário
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 4.953.726,74
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Emissão OES	outubro, 2019
	Data prevista conclusão	maio, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	28 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	96,73%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Outubro, 2021
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	outubro, 2021
	Conclusão	

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 4 OBRAS

1	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 35.000.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	dezembro, 2021
	Publicação do Edital	março, 2022
	Homologação do Edital	previsão março, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão março, 2022
	Fase atual	Em análise Recebimento Definitivo Projetos

2	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.662.652,24
	Início do procedimento de preparação da licitação	novembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	novembro, 2021
	Publicação do Edital	dezembro, 2021
	Homologação do Edital	previsão abril, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão abril, 2022
	Fase atual	Em licitação

3	TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	fevereiro, 2022
	Publicação do Edital	março, 2022
	Homologação do Edital	previsão março, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão março, 2022
	Fase atual	Em análise Recebimento Definitivo Projetos

4	PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	fevereiro, 2022
	Publicação do Edital	março, 2022
	Homologação do Edital	previsão março, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão março, 2022
	Fase atual	Em análise Recebimento Definitivo Projetos

1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS

1	MARINGÁ - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 899.994,58	
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	38	
	Prazo decorrido de execução (meses)	40	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2021	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	3
	% financeiro realizado consolidado	93,61%	
	Saldo a pagar	R\$ 57.548,84	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ASSESSORAMENTO		
		Valor do contrato	% realizado
		R\$ 199.633,89	93,75%

2	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	Construção CJC	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	47	
	Prazo decorrido de execução (meses)	44	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	6
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	24,55%	
	Saldo a pagar	R\$ 3.758.374,13	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO		
		Valor do contrato	% realizado
		R\$ 901.144,22	26,97%

3	COLOMBO - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 457.187,55	
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	29	
	Prazo decorrido de execução (meses)	26	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	26,74%	

Saldo a pagar	R\$ 334.948,70	
% financeiro não consolidado (se houver)		
CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL		
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO	R\$ 114.800,00	20,00%

4	PONTA GROSSA - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 784.739,75	
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	18	
	Prazo decorrido de execução (meses)	16	
	Previsão de conclusão	abril, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	20,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 627.791,80	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 164.800,00	7,00%

	CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000		
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 447.447,00	
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES	julho, 2020	
	% físico realizado	Fases previstas	13
		Fases recebidas	0
	% financeiro realizado consolidado	10,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 402.702,30	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

5	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	18	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	Previsão de conclusão	janeiro, 2022	
6	PARANAÍ - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	19	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2022	
7	UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	22	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	

NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800	
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 397.624,71
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
Emissão OES	fevereiro, 2021
% físico realizado	Fases previstas 34 Fases recebidas 6
% financeiro realizado consolidado	46,66%
Saldo a pagar	R\$ 212.109,44
% financeiro não consolidado (se houver)	56,11%
NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	9
Prazo decorrido de execução (meses)	10
Previsão de conclusão	dezembro, 2021
8 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	10
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	janeiro, 2022
9 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500	Construção Novo Fórum
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	12
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	março, 2022
10 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	10
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	janeiro, 2022
11 TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	10
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	janeiro, 2022
12 PEABIRÚ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	11
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
13 IPORÃ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	11
Prazo decorrido de execução (meses)	12
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
14 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	12
Prazo decorrido de execução (meses)	12


	Previsão de conclusão	março, 2022
15	MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	12
	Prazo decorrido de execução (meses)	12
	Previsão de conclusão	março, 2022
16	WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	12
	Prazo decorrido de execução (meses)	12
	Previsão de conclusão	março, 2022

	JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800	
	Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 208.999,00
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME
	Emissão OES	julho, 2021
	% físico realizado	Fases previstas 10 Fases recebidas 0
	% financeiro realizado consolidado	0,00%
	Saldo a pagar	R\$ 208.999,00
	% financeiro não consolidado (se houver)	
17	JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	7
	Prazo decorrido de execução (meses)	7
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
18	PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	8
	Prazo decorrido de execução (meses)	7
	Previsão de conclusão	março, 2022
19	QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	7
	Prazo decorrido de execução (meses)	7
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
20	LOANDA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	9
	Prazo decorrido de execução (meses)	7
	Previsão de conclusão	abril, 2022
21	MARIALVA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	10
	Prazo decorrido de execução (meses)	7
	Previsão de conclusão	maio, 2022
22	SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	8

Prazo decorrido de execução (meses)	7
Previsão de conclusão	março, 2022
23 COLORADO - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
Emissão OES	julho, 2021
Prazo previsto execução (meses)	8
Prazo decorrido de execução (meses)	7
Previsão de conclusão	março, 2022

24 CAMPO MOURÃO	Usina Fotovoltaica
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 119.736,04
Contratado	MORAN JPROJETOS E MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI
Emissão OES	outubro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	4
Prazo decorrido de execução (meses)	4
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
% físico realizado	Fases previstas 3 Fases recebidas 0
% financeiro realizado consolidado	0,00%
Saldo a pagar	R\$ 119.736,04
% financeiro não consolidado (se houver)	15,00%

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:

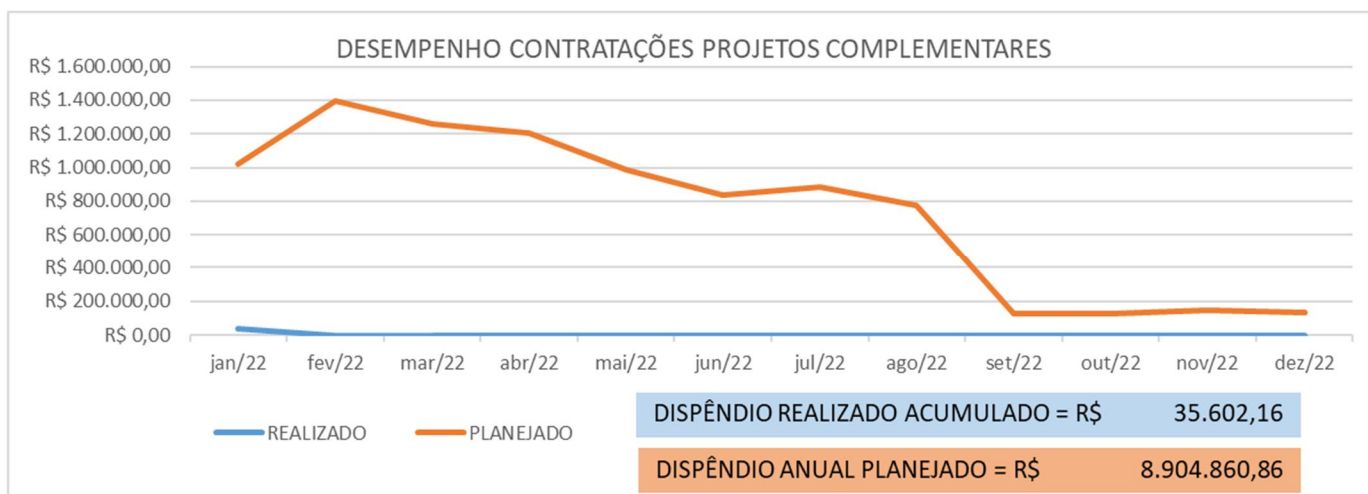

1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS

1	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000		Construção Fórum Novo		PRAZO OK	
					ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 100.000,00			ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação			outubro, 2021		
	Prazo estimado homologação da contratação			novembro, 2021		
	Prazo estimado emissão OES			dezembro, 2021		
	Prazo estimado conclusão dos projetos			julho, 2022		
	Fase ou localização atual					
	DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES					

2	IRATI - PADRÃO 5000		Construção Fórum Novo		PRAZO OK	
					ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 100.000,00			ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação			outubro, 2021		
	Prazo estimado homologação da contratação			novembro, 2021		
	Prazo estimado emissão OES			dezembro, 2021		
	Prazo estimado conclusão dos projetos			maio, 2022		
	Fase ou localização atual					
	DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES					

3	CURITIBA - SEDE MAUÁ		Usina Fotovoltáica		PRAZO OK	
					ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 60.000,00			ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação			FINALIZADO		
	Prazo estimado emissão Edital ao DP			FINALIZADO		
	Prazo estimado publicação do Edital			FINALIZADO		
	Prazo estimado homologação do Edital			março, 2022		
	Prazo estimado emissão OES			abril, 2022		
	Fase ou localização atual					
	EM LICITAÇÃO PELO DPL					

4	CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM PADRÃO 1500			PRAZO OK		
				ALERTA		
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 240.000,00			ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação			novembro, 2021		
	Prazo estimado emissão Edital ao DP			novembro, 2021		
	Prazo estimado publicação do Edital			fevereiro, 2022		
	Prazo estimado homologação do Edital			março, 2022		
	Prazo estimado emissão OES			março, 2022		
	Fase ou localização atual					
	DEA-DPC PARA INSTRUÇÃO VISANDO LICITAÇÃO					

5	MEDIANEIRA - PADRÃO 1800		Construção Fórum Novo		PRAZO OK	
					ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 20.899,00			ATRASADO	

Início do procedimento de preparação da licitação	janeiro, 2022
Prazo estimado emissão Edital ao DP	janeiro, 2022
Prazo estimado publicação do Edital	janeiro, 2022
Prazo estimado homologação do Edital	fevereiro, 2022
Prazo estimado emissão OES	março, 2022
Fase ou localização atual EM ANÁLISE TERRENOS OFERTADOS A DOAÇÃO	

1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de viabilidade.

1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno.

COMARCA	EXPEDIENTE	STATUS	OBSERVAÇÕES	MOV. SEI
1	ALTO PARANÁ	0044842-67.2015	SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA	7159920
2	MORRETES	0065613-61.2018	ELEITO	3296522
3	PIRAÍ DO SUL	0065866-15.2019	ELEITO	7158450
4	CÂNDIDO DE ABREU	0017074-64.2018	EM ANÁLISE	6283096
5	PARANAGUÁ	0083854-54.2016	ELEITO	2935335
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0055920-19.2019	EM ANÁLISE	7314320
7	CAPANEMA	0026468-61.2019	ELEITO	7084627
8	SENGÉS	0095784-64.2019	EM ANÁLISE	5484053
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	0061298-53.2019	EM ANÁLISE	5898310
10	PITANGA	0086215-39.2019	EM ANÁLISE	6569670
11	MEDIANEIRA	0053483-05.2019	EM ANÁLISE	6651402
12	PIRAQUARA	0080776-47.2019	EM ANÁLISE	6366887

1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados.

Comarcas com **asteriscos** indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022.


	COMARCA	Ano doação	Ano limite
1	AMPÉRE (em construção) **	2015	2017
2	ANTONINA	2012	2015
3	CAMPO MOURÃO **	2019	2028
4	CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) **	2019	2029
5	CARLÓPOLIS **	2011	2024
6	CENTENÁRIO DO SUL **	2009	Sem prazo
7	CLEVELÂNDIA **	2021	Sem prazo
8	COLOMBO **	2008	Sem prazo
9	CORBÉLIA **	2014	2024
10	FAXINAL **	2020	Sem prazo
11	FRANCISCO BELTRÃO (em construção)	2017	Sem prazo
12	IPORÃ **	2019	Sem prazo
13	IRATI **	2020	Sem prazo
14	IRETAMA **	2020	Sem prazo
15	JAGUARIAÍVA **	2010	Sem prazo
16	JANDAIA DO SUL **	2018	Sem prazo
17	JOAQUIM TÁVORA	2015	2022/2025
18	LAPA	2009	Sem prazo
19	LOANDA **	2019	2025
20	MANDAGUAÇÚ	2010	2012
21	MANGUEIRINHA **	2019	Sem prazo
22	MARIALVA **	2011	2024
23	MARINGÁ **	2012	2032+20
24	NOVA AURORA **	2017	Sem prazo
25	PARANAVAÍ **	2018	Sem prazo
26	PEABIRÚ **	2011	Sem prazo
27	PONTA GROSSA **	2013	Sem prazo

28	PONTAL DO PARANÁ **	2019	Sem prazo
29	PRUDENTÓPOLIS **	2020	Sem prazo
30	QUEDAS DO IGUAÇÚ **	2019	Sem prazo
31	RIBEIRÃO DO PINHAL **	2009	Sem prazo
32	ROLÂNDIA	1998	2000
33	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA **	2018	Sem prazo
34	SÃO JERÔNIMO DA SERRA **	2019	Sem prazo
35	SÃO MATEUS DO SUL **	2020	Sem prazo
36	SENGÉS	2011	2013
37	TELÊMACO BORBA	2011	Sem prazo
38	TERRA RICA **	2018	Sem prazo
39	UNIÃO DA VITÓRIA **	2016	2024
40	URAI **	2009	Sem prazo
41	WENCESLAU BRAZ **	2018	Sem prazo


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		21/02/2022
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		899
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		704
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	102
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	58
	Idade média das construções (anos)	26,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA)		321.490,24
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.580,19
ÁREA TOTAL DE IMOVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.660,18
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		390.730,61
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR		583.765,54
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		637.630,59
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		129.082,99
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA		964.557,33
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS	D	45
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS		14
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 760.969.285,52
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.091.554.550,40
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR		R\$ 1.852.523.835,92
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR		
1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR		
	EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	160	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	47
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	1	0
INTERIOR TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO	A	C
	194	63
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA		
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA	B	36
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO	(A+B)	230
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)	(A+B+C)	293
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)	(D)	45
TOTAL GERAL DE UNIDADES	(A+B+C+D)	338

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

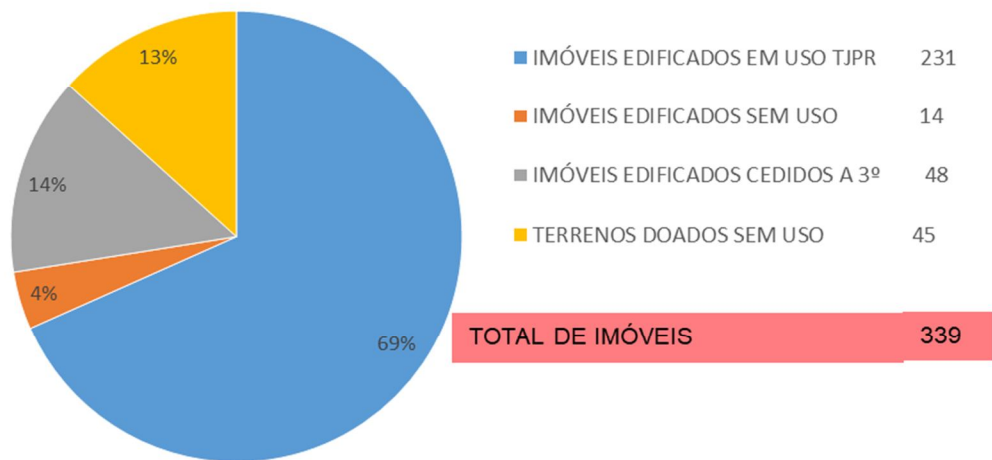

3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)


Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente.

POSIÇÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	TERRENO DOADO?
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
2	AMPÉRE	35	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
4	COLOMBO	64	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
5	JAGUARIAÍVA	80	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
6	MARINGÁ	102	ESTADO DO PARANÁ	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO NOVO FÓRUM	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
7	BOCAIÚVA DO SUL	119	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	NÃO
8	CORBÉLIA	144	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM (AGUARDA OES)	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
9	PIRAQUARA	158	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
10	IRATI	164	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	TERRENO DOADO
11	PONTAL DO PARANÁ	165	MUNICÍPIO	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO DA OBRA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
12	CLEVELÂNDIA	166	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
13	PARANAVAÍ	166	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
14	ANTONINA	168	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
15	RIBEIRÃO DO PINHAL	172	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
16	PARANAGUÁ	181	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
17	MORRETES	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO

18	FRANCISCO BELTRÃO	184	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
19	PIRAÍ DO SUL	191	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
20	TELÊMACO BORBA	196	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO DOADO
21	URAI	200	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
22	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	203	TJPR	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
23	SENGÉS	221	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
24	UNIÃO DA VITÓRIA	225	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
25	PITANGA	236	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
26	JANDAIA DO SUL	240	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
27	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	244	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
28	MANDAGUAÇU	251	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
29	PEABIRÚ	257	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
30	TERRA RICA	259	ESTADO DO PARANÁ	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO DA OBRA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
31	SÃO JOÃO DO TRIUNFO	261	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
32	JAGUAPITÁ	263	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO

33	SARANDI	268	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	NÃO
34	MANDAGUARÍ	268	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
35	TEIXEIRA SOARES	268	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
36	PRUDENTÓPOLIS	281	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
37	SANTA MARIANA	282	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
38	CÂNDIDO DE ABREU	289	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
39	PRIMEIRO DE MAIO	300	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	NADA CONSTA	NÃO
40	IPORÃ	302	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO

4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

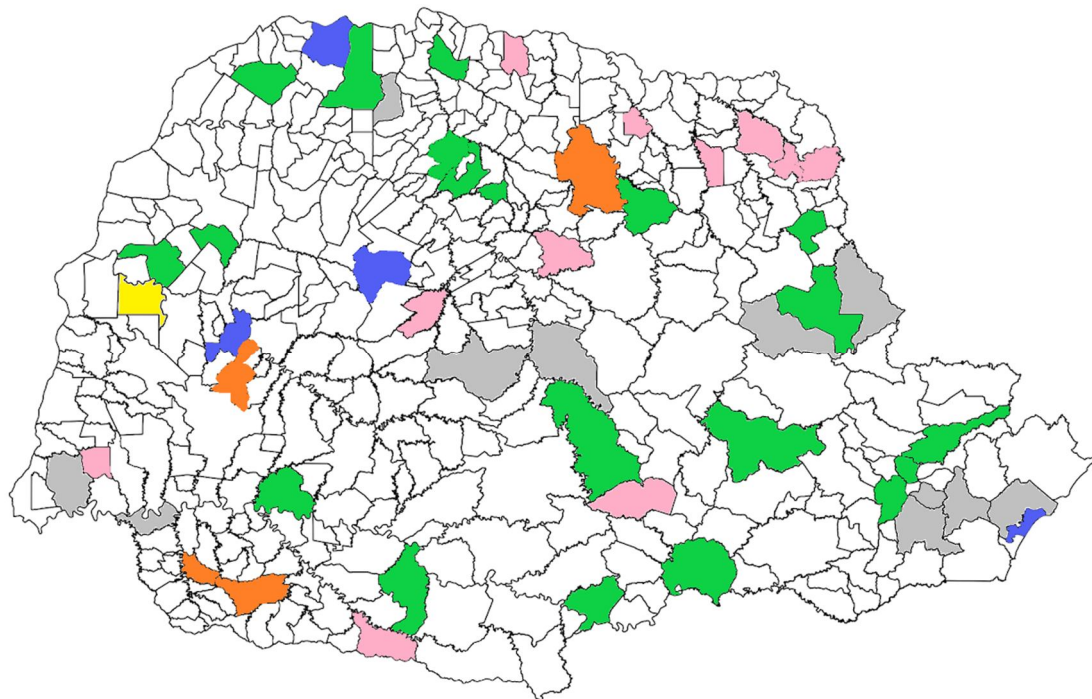

Obras em andamento
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal
Ampére – Construção Novo Fórum
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum
Corbélia – Construção Novo Fórum

Obras em recebimento
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum
Curitiba – Sonorização plenário Anexo

Obras em licitação ou preparação de edital
Campo Mourão – Novo Fórum
Nova Aurora – Novo Fórum
Terra Rica – Novo Fórum
Pontal do Paraná – Novo Fórum

Projetos complementares contratados
Maringá – Projetos e Assessoramento – em recebimento
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC
Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Peabiru, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum
Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçu, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos

Projetos complementares em contratação/preparação
Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum
Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica
Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis
Medianeira – Projetos Novo Fórum

Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade
--

--

Terrenos em análise ou legalização de doação
Alto Paraná
Morretes
Piraí do Sul
Cândido de Abreu
Paranaguá
São José dos Pinhais
Capanema
Sengés
São Miguel do Iguacú
Pitanga
Medianeira
Piraquara

5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 16 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade.

No período do relatório não foram finalizadas e recebidas obras de acessibilidade nas Comarcas.

No período do relatório mantém-se em Recebimento Provisório as obras de:

- Pleno do Palácio da Justiça
- Santa Helena


PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL				
	COMARCA	STATUS	OES	Observações
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
2	Capanema	SOB ANÁLISE DA DM		16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação
3	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo com mais 45 dias para finalização
4	Curitiba - Tribunal do Juri	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	29/10/2020	14/02/2022 Em análise aditivo de preço e prazo (30 dias)
5	Curitiba - Tribunal Pleno 12º andar Anexo	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6341494	22/07/2020	09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 26/02/2021 Autorizado 3º aditivo de prazo em mais 30 dias
6	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação
7	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação
8	Loanda	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/07/2021	10/02/2022 Formalizado termo aditivo de preço e prazo, concedido mais 60 dias para finalização 09/12/2021 Em análise aditivo de preço e prazo
9	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
10	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto

11	Nova Londrina	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA	15/09/2021	04/02/2022 Formalizado aditivo de prazo, concedido mais 60 dias para finalização 09/12/2021 Em análise aditivo de prazo
12	Quedas do Iguaçu	EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
13	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto
14	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias
15	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019
16	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação 03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura




6. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 1.826.413,04 correspondentes a 10,13 % do valor inicialmente planejado de R\$ 18.029.967,90 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proj. complementares	R\$ 35.602,16	R\$ 35.602,16
Manutenção e Atas	R\$ 1.790.810,88	R\$ 1.790.810,88
ACUMULADO ANUAL	R\$ 1.826.413,04	R\$ 1.826.413,04

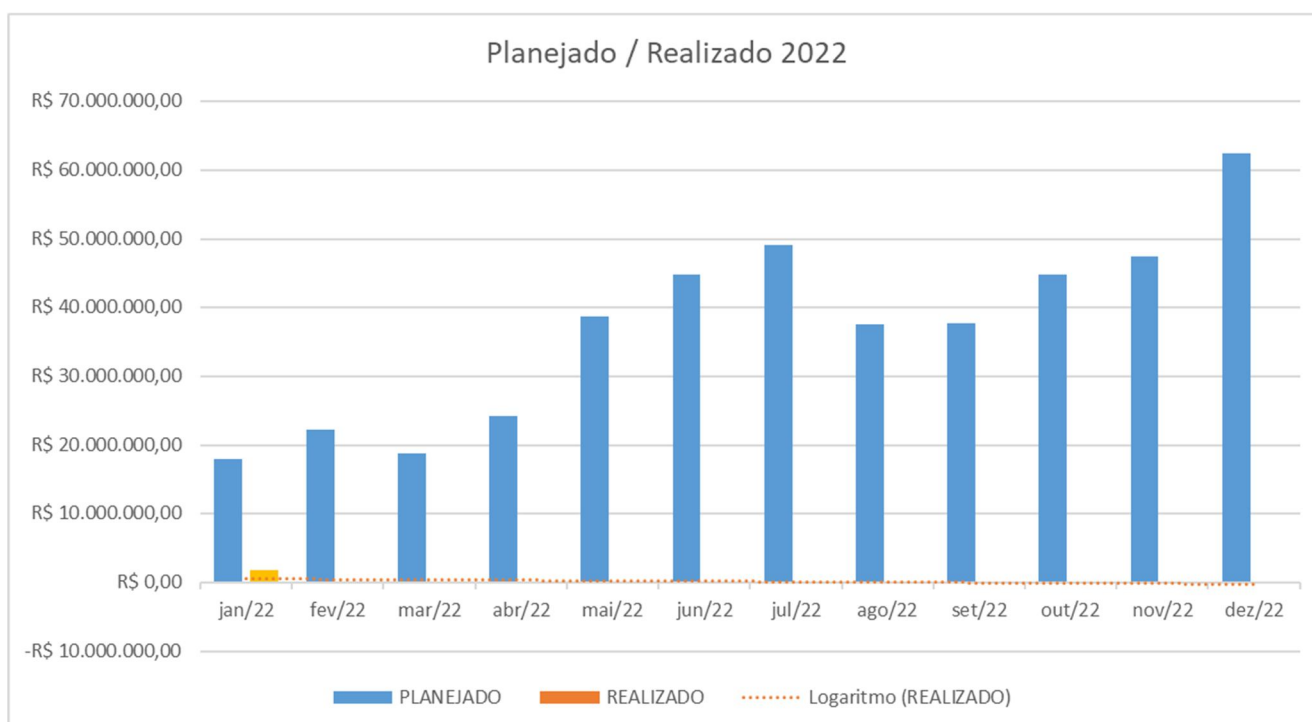

6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)

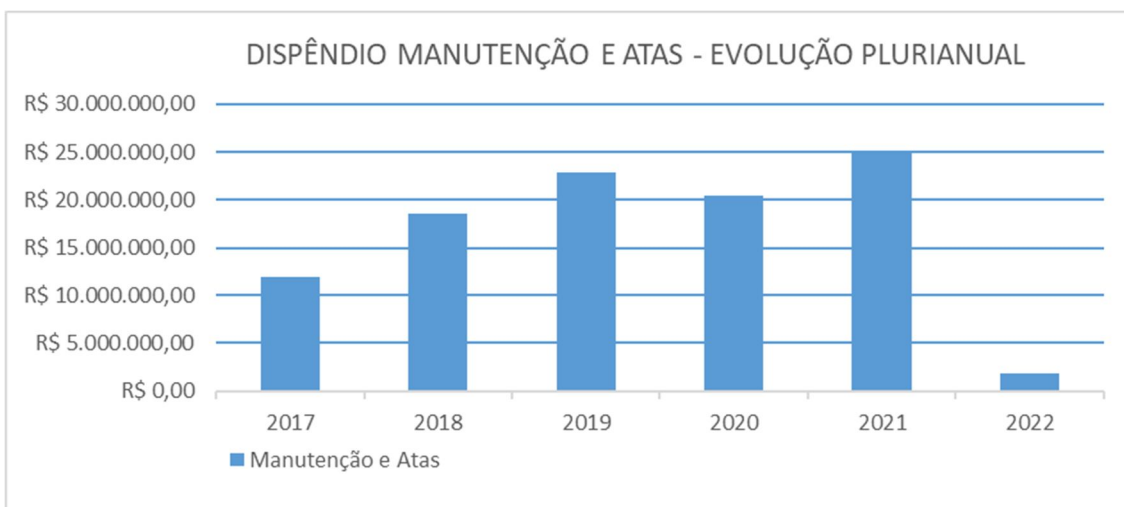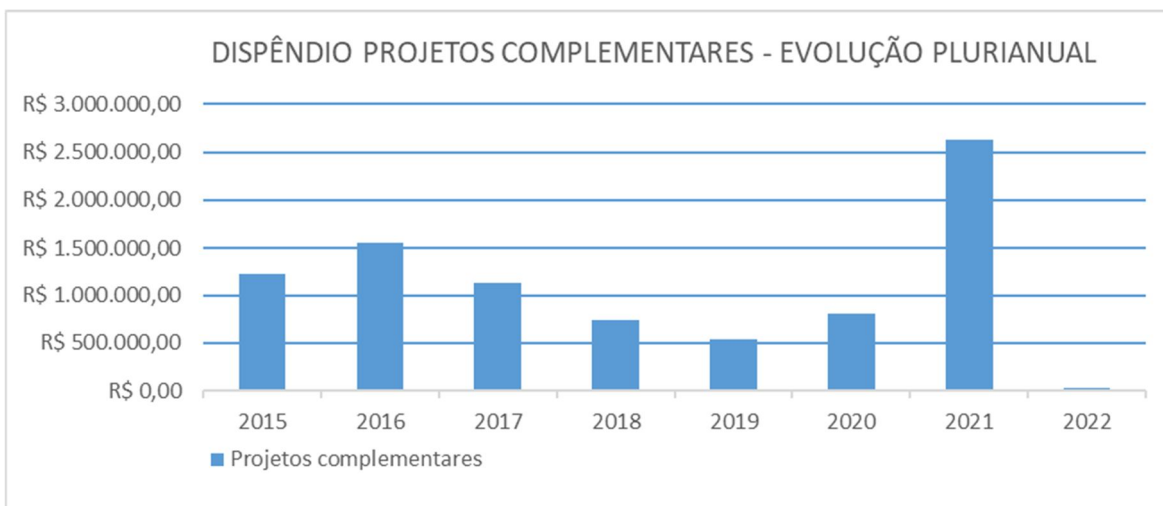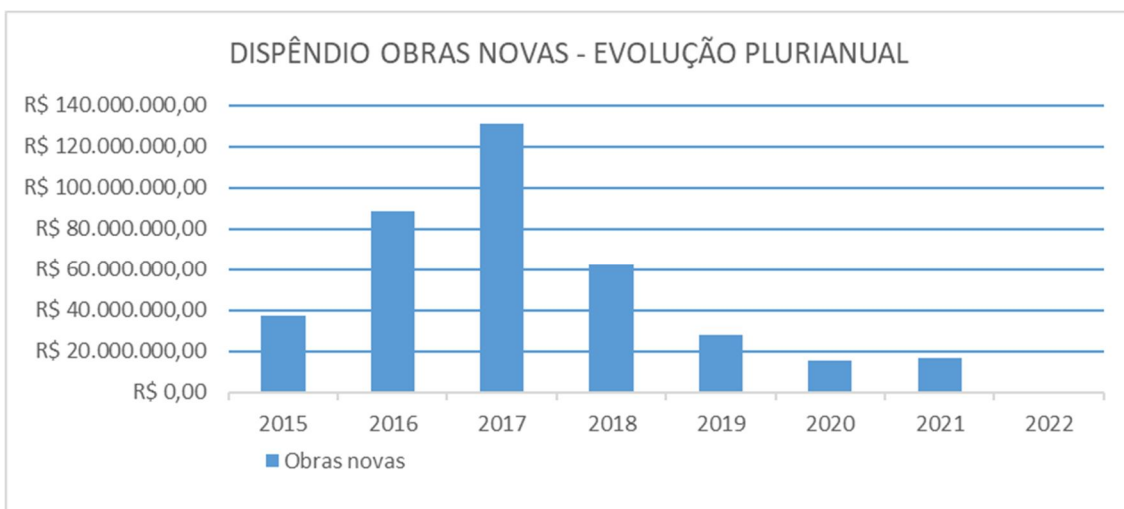

7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

7.1 Manutenção Elevadores

7.2 Manutenção Ar condicionado

7.3 Manutenção Geradores

7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)


7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center

7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia

7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado

7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R\$ 1.790.810,88 e acumulado anual de R\$ 1.790.810,88, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

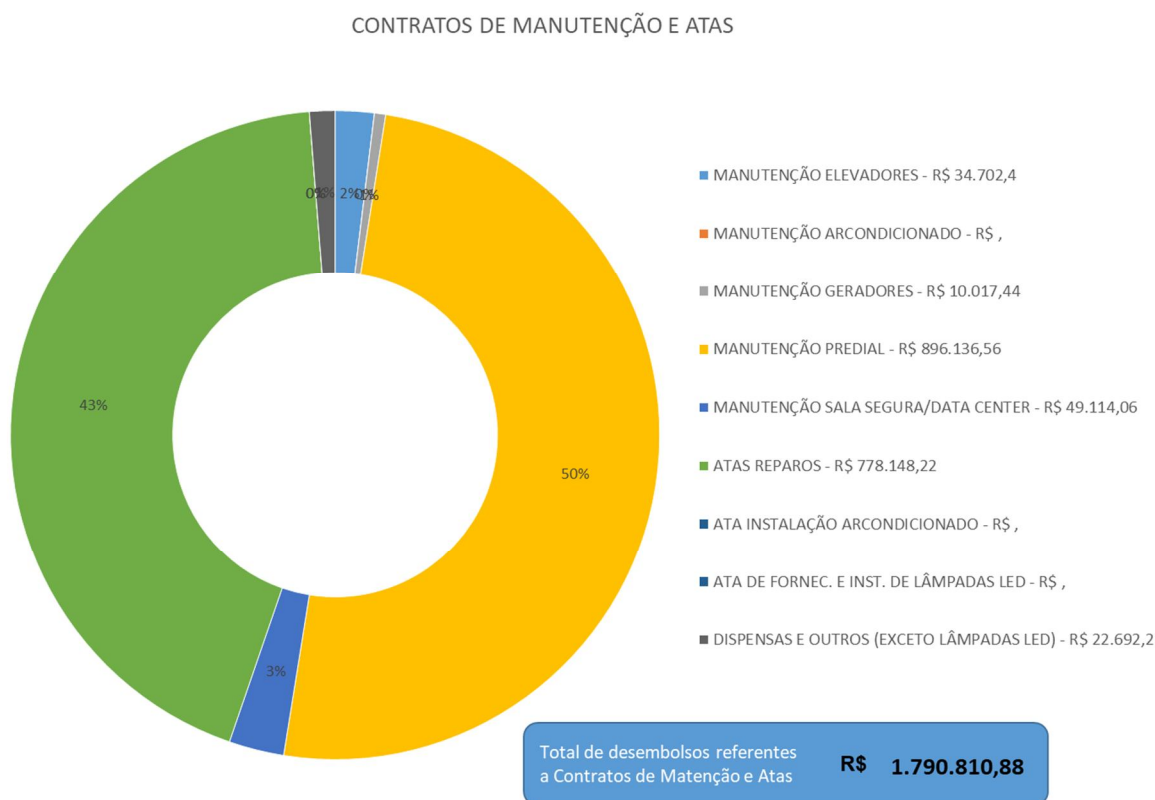

DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face a próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).


7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 481.501,56
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	03/05/2022	R\$ 140.515,56.

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 34.702,40
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 34.702,40

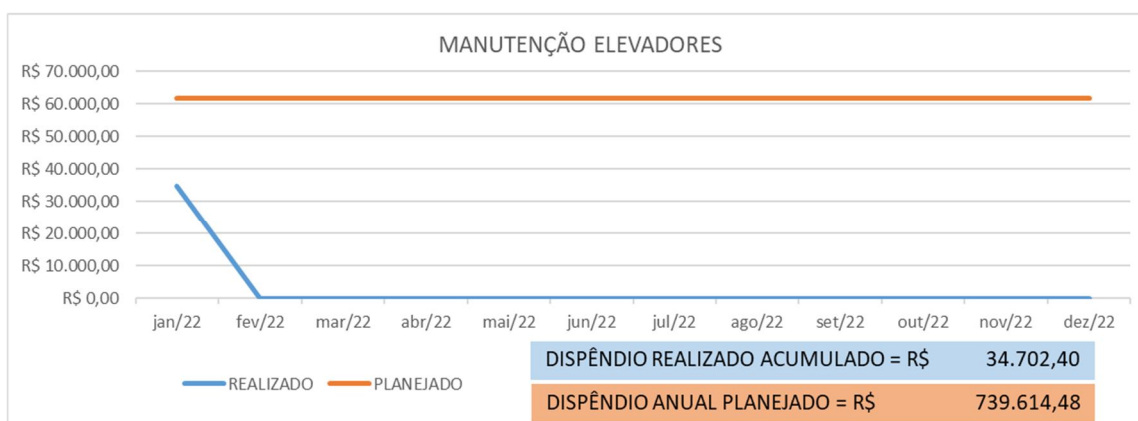

Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Regional Leste	Dados não informados		
Regional Oeste	Dados não informados		
Regional Norte	Dados não informados		


7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	08/02/2023	R\$ 5.759.707,44

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00

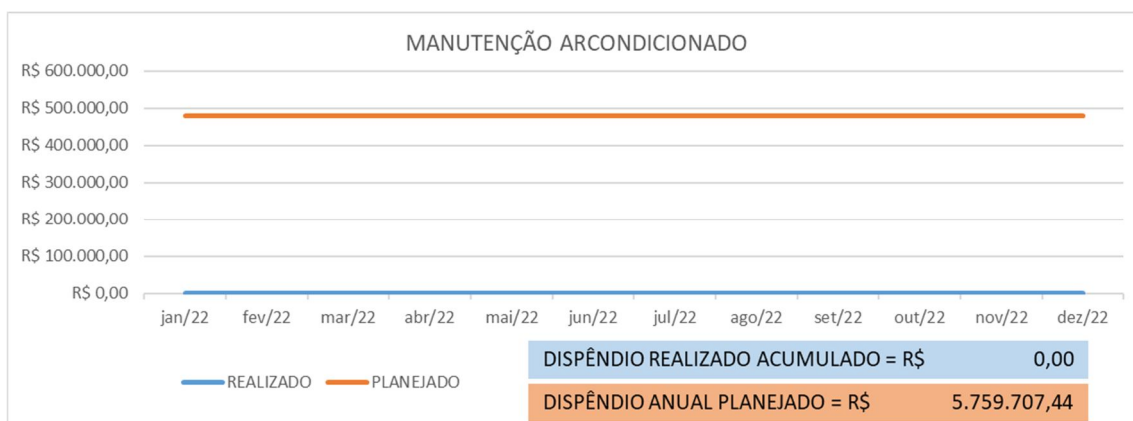


Destino	Total de chamados	Finalizados	Abertos
Paraná total			
Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório)		Dados não informados	

7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paran , com fornecimento integral de pe as.

Destino	Contratado	Vig�ncia	Valor contrato
Paran� total	EFL SILVA MANUTEN�O DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	12/08/2022	R\$ 294.166,48
Para unidades atendidas – ver ANEXO I			
Desembolso no per�odo do Relat�rio			R\$ 10.017,44
Desembolso acumulado no ano do Relat�rio			R\$ 10.017,44

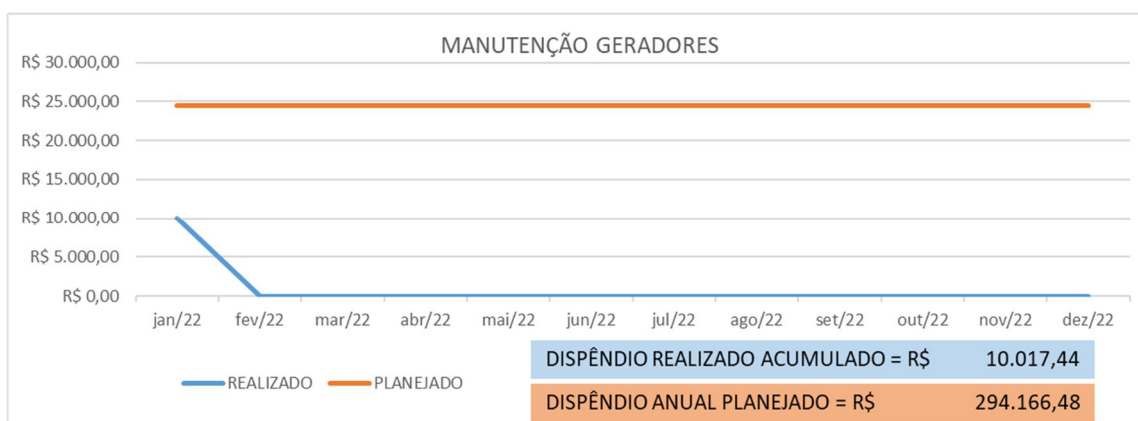

Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paran� total	Dados n�o informados		

7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.


Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	01/04/2022	R\$ 12.097.078,36

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 896.136,56
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 896.136,56

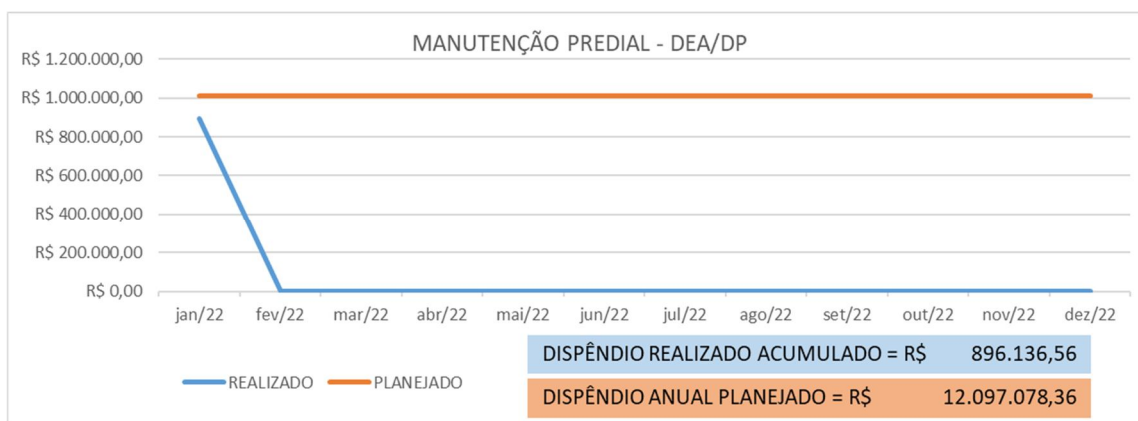

TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência dez/2021 fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato (exceto Regional 1)

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 6.323,81
CASCATEL	Atestado	R\$ 11.024,16
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 4.197,77
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 9.237,68
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 894,64
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 13.611,08
LONDRINA	Atestado	R\$ 18.512,84
MARINGÁ	Atestado	R\$ 8.876,89
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 7.248,47
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 6.536,72
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 1.704,41
TELÊMADO BORBA	Atestado	R\$ 8.140,96
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 3.727,38
13 UNIDADES	TOTAL:	R\$ 100.036,80

Relação das Cidades (exceto Regional 1)

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
Alto Paraná	Atestado	R\$ 49,81
Alto Piquiri	Atestado	R\$ 863,12
Altônia	Atestado	R\$ 580,03
Ampére	Atestado	R\$ 911,30
Andirá	Atestado	R\$ 552,01
Arapongas	Atestado	R\$ 135,07
Arapoti	Atestado	R\$ 238,52
Assaí	Atestado	R\$ 635,88
Assis Chateaubriand	Atestado	R\$ 101,26
Astorga	Atestado	R\$ 582,58
Bandeirantes	Atestado	R\$ 652,35
Barbosa Ferraz	Atestado	R\$ 230,92
Barracão	Atestado	R\$ 573,67
Bela Vista do Paraíso	Atestado	R\$ 409,02
Cambé	Atestado	R\$ 5.014,42
Campina da Lagoa	Atestado	R\$ 1.585,50
Campo Mourão	Atestado	R\$ 239,35
Cândido de Abreu	Atestado	R\$ 222,55
Cantagalo	Atestado	R\$ 524,66
Capanema	Atestado	R\$ 473,58
Capitão Leônidas Marques	Atestado	R\$ 552,69
Carlópolis	Atestado	R\$ 36,26
Cascavel	Atestado	R\$ 5.175,47
Catanduvas	Atestado	R\$ 26,71
Centenário do Sul	Atestado	R\$ 113,45
Cidade Gaúcha	Atestado	R\$ 483,07
Clevelândia	Atestado	R\$ 75,44
Congoinhas	Atestado	R\$ 98,26
Corbélia	Atestado	R\$ 1.152,49
Cornélio Procópio	Atestado	R\$ 1.150,88
Coronel Vivida	Atestado	R\$ 1.252,00
Cruzeiro do Oeste	Atestado	R\$ 2.629,32
Curiúva	Atestado	R\$ 37,28
Dois Vizinhos	Atestado	R\$ 29,48
Faxinal	Atestado	R\$ 821,72
Formosa do Oeste	Atestado	R\$ 13,07
Francisco Beltrão	Atestado	R\$ 1.720,63
Grandes Rios	Atestado	R\$ 718,66
Guaraniaçu	Atestado	R\$ 2.167,30
Guarapuava	Atestado	R\$ 8.419,88
Ibaiti	Atestado	R\$ 820,32
Icaraíma	Atestado	R\$ 1.480,02
Imbituva	Atestado	R\$ 727,42
Iporã	Atestado	R\$ 94,21
Irati	Atestado	R\$ 1.530,38
Iretama	Atestado	R\$ 281,40
Jacarezinho	Atestado	R\$ 414,57
Jaguapitã	Atestado	R\$ 1.203,22
Jaguariaíva	Atestado	R\$ 337,25
Joaquim Távora	Atestado	R\$ 110,86
Laranjeiras do Sul	Atestado	R\$ 286,75
Londrina	Atestado	R\$ 8.286,74
Mallet	Atestado	R\$ 1.294,90
Mamborê	Atestado	R\$ 576,69

Mandaguaçu	Atestado	R\$ 1.281,96
Mangueirinha	Atestado	R\$ 306,27
Manoel Ribas	Atestado	R\$ 445,25
Marialva	Atestado	R\$ 100,31
Marilândia do Sul	Atestado	R\$ 186,78
Maringá	Atestado	R\$ 3.901,31
Marmeleiro	Atestado	R\$ 70,71
Matelândia	Atestado	R\$ 62,71
Medianeira	Atestado	R\$ 806,44
Nova Aurora	Atestado	R\$ 437,22
Nova Esperança	Atestado	R\$ 12,98
Nova Fátima	Atestado	R\$ 807,44
Ortigueira	Atestado	R\$ 103,27
Palmeira	Atestado	R\$ 418,52
Palmital	Atestado	R\$ 694,89
Palotina	Atestado	R\$ 742,55
Paraíso do Norte	Atestado	R\$ 433,13
Paranavaí	Atestado	R\$ 1.457,25
Peabiru	Atestado	R\$ 592,70
Pinhão	Atestado	R\$ 566,86
Piraí do Sul	Atestado	R\$ 466,90
Ponta Grossa	Atestado	R\$ 3.189,22
Primeiro de Maio	Atestado	R\$ 426,37
Prudentópolis	Atestado	R\$ 1.142,41
Quedas do Iguaçu	Atestado	R\$ 502,48
Realeza	Atestado	R\$ 1.056,06
Reserva	Atestado	R\$ 202,53
Ribeirão Claro	Atestado	R\$ 475,32
Ribeirão do Pinhal	Atestado	R\$ 693,57
Rolândia	Atestado	R\$ 369,29
Salto do Lontra	Atestado	R\$ 806,25
Santa Fé	Atestado	R\$ 1.147,73
Santa Isabel do Ivaí	Atestado	R\$ 245,42
Santa Mariana	Atestado	R\$ 341,52
Santo Antônio do Sudoeste	Atestado	R\$ 446,66
São Jerônimo da Serra	Atestado	R\$ 420,37
São João do Ivaí	Atestado	R\$ 281,29
São João do Triunfo	Atestado	R\$ 298,09
São Mateus do Sul	Atestado	R\$ 502,31
São Miguel do Iguaçu	Atestado	R\$ 88,20
Sengés	Atestado	R\$ 102,51
Sertanópolis	Atestado	R\$ 151,23
Teixeira Soares	Atestado	R\$ 363,68
Telêmaco Borba	Atestado	R\$ 5.997,87
Terra Boa	Atestado	R\$ 2.278,04
Terra Rica	Atestado	R\$ 229,51
Terra Roxa	Atestado	R\$ 742,55
Toledo	Atestado	R\$ 473,52
Tomazina	Atestado	R\$ 667,41
Ubiratã	Atestado	R\$ 257,92
Umuarama	Atestado	R\$ 185,99
União da Vitória	Atestado	R\$ 2.563,29
Uraí	Atestado	R\$ 154,44
Xambê	Atestado	R\$ 643,94
108 CIDADES	TOTAL:	R\$ 100.036,80

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção

Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia - 05/04/2021 até 14/12/2021

DADOS NÃO FORNECIDOS.

PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – FEV/2022 (exceto Regional 1)

DADOS NÃO FORNECIDOS.

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	22/07/2022	R\$ 444.998,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2022	R\$ 547.800,00

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 49.114,06
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 49.114,06

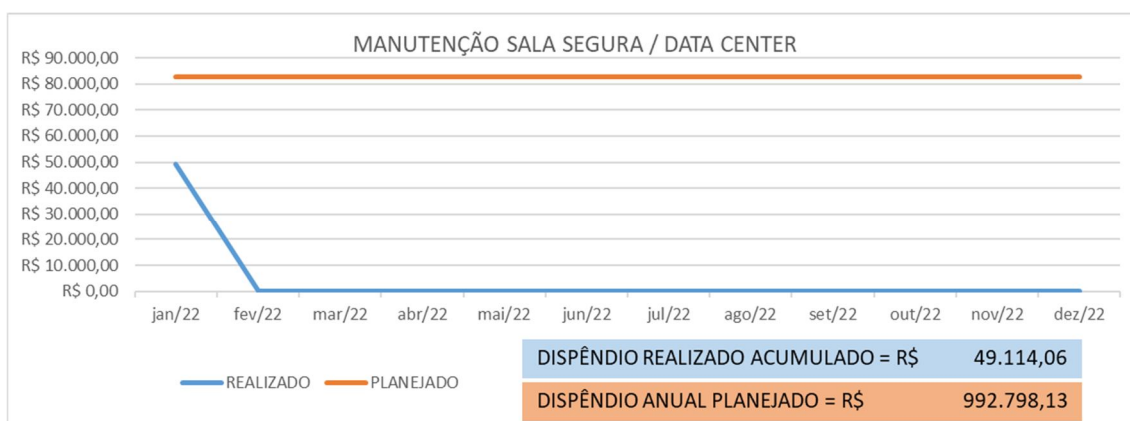

7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.


Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional RMC e Litoral	JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21/09/2021	R\$ 1.000.000,00
Regional Francisco Beltrão	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	12/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	01/12/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Jacarezinho	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/08/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Umuarama	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	29/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Regional Ponta Grossa	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00
Regional Maringá	PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	11/01/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Curitiba	TEK TECNOLOGIA LTDA	25/01/2022	R\$ 1.500.000,00

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Contrato Regional Maringá: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0122320-44.2021.8.16.6000).

Contrato Regional Curitiba: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0122322-14.2021.8.16.6000).

Desembolso no período do Relatório	R\$ 778.148,22
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 778.148,22

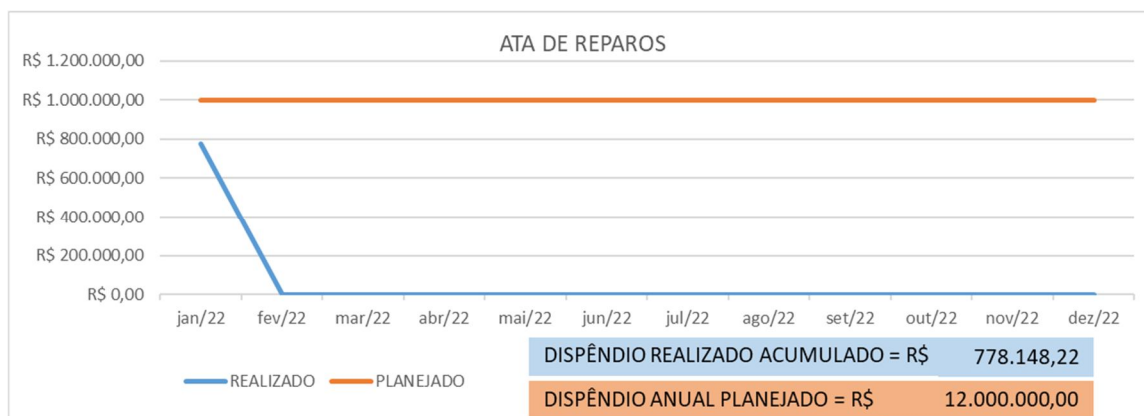

CONTRATOS/OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPAROS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ATUALIZADO	VALOR MEDIDO	DATA FINAL
CTBA JE STA FELICIDADE - REPAROS	R\$ 891.205,00	R\$ 1.071.041,76	R\$ 1.005.356,69	08/01/2021
SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS	R\$ 245.940,39	O MESMO	R\$ 122.970,20	10/02/2021
COPEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	R\$ 3.400.089,00	R\$ 3.511.099,85	R\$ 678.812,71	07/06/2021
UMUARAMA - REFORMA	R\$ 160.003,75	R\$ 204.259,82	R\$ 120.002,82	07/12/2021
CTBA - EDIFÍCIO PERY MOREIRA	R\$ 2.499.345,89	R\$ 2.956.286,43	R\$ 2.895.771,44	09/12/2021
ANDIRÁ - REPAROS	R\$ 275.244,16	R\$ 347.153,17	R\$ 54.625,17	22/12/2021
CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA - ELETROPOSTO	R\$ 78.105,43	O MESMO	R\$ 41.286,70	25/12/2021
PALÁCIO DA JUSTIÇA - ELETROPOSTO	R\$ 78.105,43	O MESMO	R\$ 41.286,70	25/12/2021
CASCADEL - REPAROS	R\$ 165.122,89	O MESMO	R\$ 108.755,49	13/01/2022
SERTANÓPOLIS - REFORMA	R\$ 260.105,71	R\$ 288.486,54	R\$ 173.403,81	14/01/2022
LOANDA - REFORMA	R\$ 189.980,76	O MESMO	R\$ 126.794,33	15/01/2022
SANTO ANTONIO DA PLATINA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 62.924,91	O MESMO	ZERO	20/01/2022
CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA BIBLIOTECA	R\$ 97.061,96	O MESMO	ZERO	20/01/2022
CURITIBA ANEXO - ATELIE DE INOVAÇÃO - REPAROS	R\$ 9.752,74	O MESMO	ZERO	25/01/2022
MAIS DE UMA - MEDIÇÃO E TREINAMENTO COPEL	R\$ 123.000,00	O MESMO	R\$ 54.625,17	02/02/2022
PORECATU - REFORMA	R\$ 99.970,73	R\$ 143.750,89	R\$ 90.107,70	06/02/2022

SANTA FELICIDADE - NOVA ENTRADA ENERG	R\$ 74.099,64	R\$ 83.760,95	ZERO	15/02/2022
CTBA VEP - MANUTENÇÕES	R\$ 357.439,84	R\$ 357.439,84	R\$ 319.754,62	16/02/2022
SANTA FÉ - CFTV	R\$ 99.994,63	O MESMO	R\$ 99.994,63	19/02/2022
CURITIBA PALÁCIO - SONORIZAÇÃO E VIDEOCONF	R\$ 4.749.203,43	R\$ 4.955.883,05	R\$ 4.794.100,77	26/02/2022
CENTENÁRIO DO SUL - REPAROS	R\$ 88.093,10	O MESMO	ZERO	03/03/2022
NOVA LONDRINA - REFORMA	R\$ 99.484,67	O MESMO	R\$ 19.780,06	14/03/2022
CORNELIO PROCOPIO - LAUDO	R\$ 10.000,00	O MESMO	ZERO	24/03/2022
SALA SEGURA - PRÉDIO ANEXO	R\$ 218.809,56	R\$ 273.900,00	R\$ 165.271,32	01/04/2022
CTBA VEP - LINHA DE VIDA	R\$ 6.500,00	O MESMO	ZERO	04/04/2022
FRANCISCO BELTRÃO - CONSTRUÇÃO	R\$ 35.555.555,55	O MESMO	R\$ 5.255.489,30	06/04/2022
LOANDA - CFTV INÍCIO DE OBRA	R\$ 60.067,47	O MESMO	R\$ 60.067,47	10/04/2022
JUIZADOS DO BOQUEIRÃO	R\$ 137.171,54	O MESMO	ZERO	15/04/2022
TERRA RICA - CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 46.170,21	O MESMO	ZERO	16/04/2022
JAGUAPITÃ - REPAROS - CFTV	R\$ 95.093,83	O MESMO	ZERO	10/05/2022
MANDAGUAÇU - REPAROS - CFTV	R\$ 68.314,53	O MESMO	ZERO	15/05/2022
TERRA RICA - CFTV	R\$ 68.314,53	O MESMO	ZERO	15/05/2022
JANDAIA DO SUL - REPAROS	R\$ 71.723,13	O MESMO	ZERO	15/05/2022
MANDAGUARI - REPAROS	R\$ 97.124,29	O MESMO	ZERO	01/06/2022

MARINGÁ - REPAROS	R\$ 98.672,33	O MESMO	ZERO	14/06/2022
SARANDI - REPAROS	R\$ 98.869,97	O MESMO	ZERO	14/06/2022
PARANAÍ - REPAROS	R\$ 85.151,61	O MESMO	ZERO	14/06/2022
LONDRINA CONSTRUÇÃO CRIMINAL	- F R\$ 48.621.777,84	R\$ 49.590.234,95	R\$ 9.877.977,48	26/06/2022
CTBA SALA COFRE - MANUTENÇÃO	R\$ 444.998,13	R\$ 425.946,48	R\$ 153.752,02	27/07/2022
MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO GERADORES	R\$ 81.055,56	O MESMO	R\$ 27.018,52	18/08/2022
VÁRIAS - SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	R\$ 3.400.089,00	R\$ 3.511.099,85	R\$ 1.010.312,08	27/12/2022
CORBBÉLIA - CONSTRUÇÃO	R\$ 9.378.308,06	O MESMO	ZERO	29/12/2022


7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -EPP	11/08/2021	R\$ VENCIDO

Contrato Paraná total: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0067526-73.2021.8.16.6000).

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00

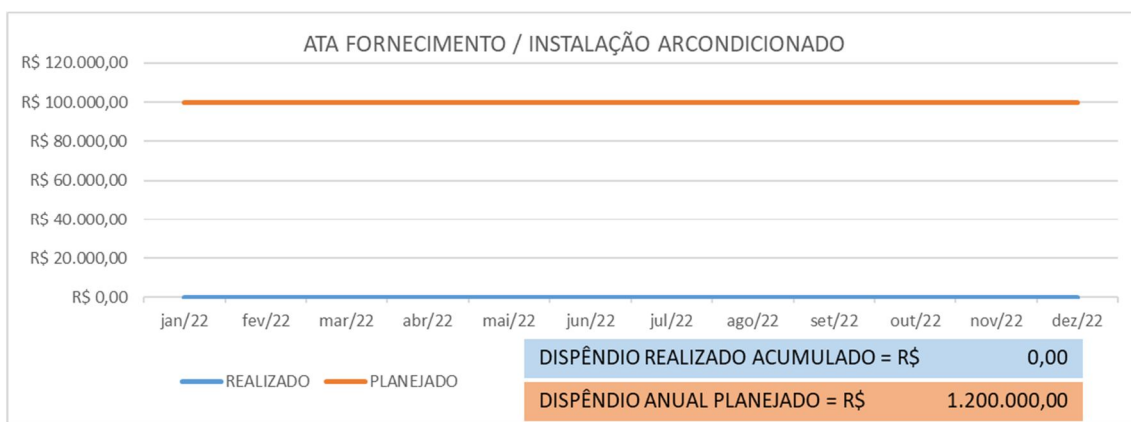


Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total	Dados não informados		

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED


Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	26/02/2025	R\$ 3.511.099,85

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado total do contrato até o momento	R\$ 1.010.312,06

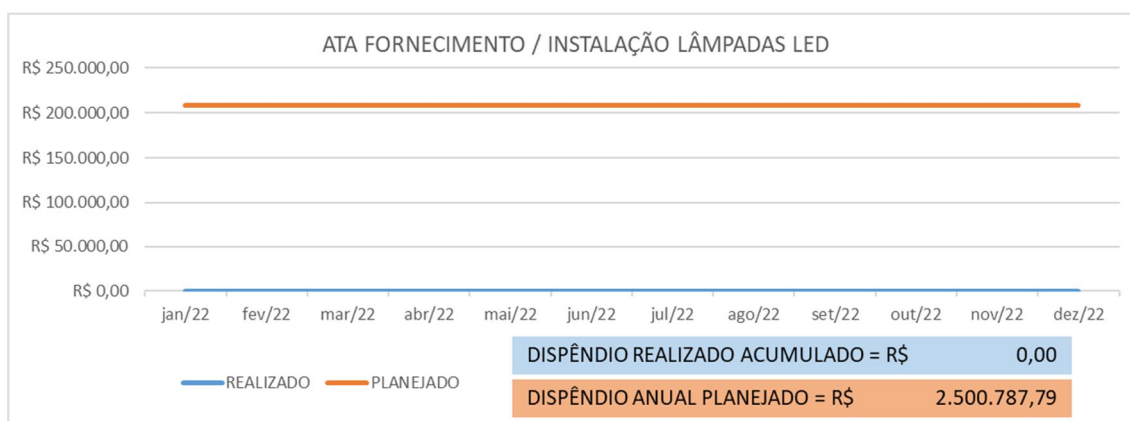

Demais contratações em regime de dispensa:

Desembolso no período do Relatório	R\$ 22.692,20
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 22.692,20

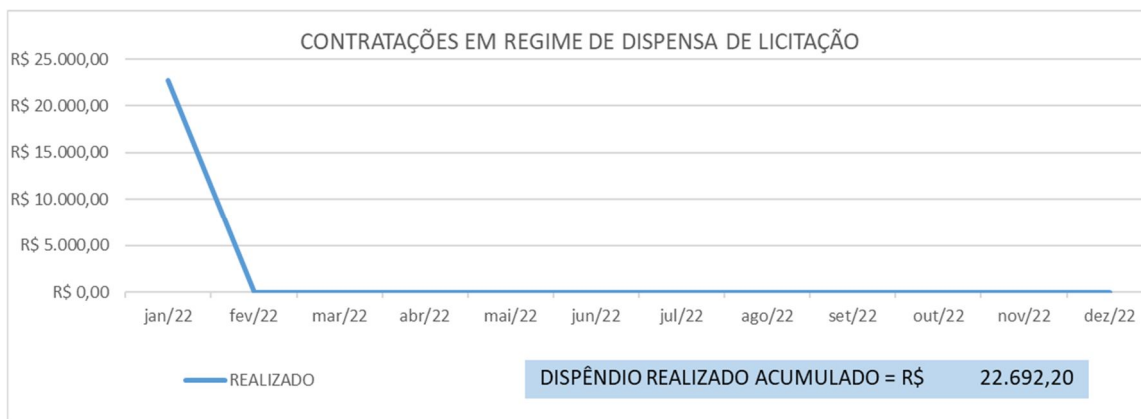

8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS**REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Almirante tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - alvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São José dos Pinhais, v. Infância e juventude
São José dos Pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória
União da vitória – v de família

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçu
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul
Marechal cândido rondon
Medianeira

Pato branco
Quedas do iguaçu
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçu
Toledo

REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã
Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringá – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo antônio da platina
Telêmaco borba
Terra boa
Tibagi

8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

Split Hi Wall 7.500Btu/h	17
Split Hi Wall 9.000Btu/h	198
Split Hi Wall 12.000Btu/h	322
Split Hi Wall 18.000Btu/h	788
Split Hi Wall 22.000Btu/h	52
Split Hi Wall 24.000Btu/h	521
Split Hi Wall 30.000Btu/h	346
Split Piso-Teto 12.000Btu/h	21
Split Piso-Teto 18.000Btu/h	24
Split Piso-Teto 24.000Btu/h	58
Split Piso-Teto 30.000Btu/h	36

Split Piso-Teto 36.000Btu/h	201
Split Piso-Teto 42.000Btu/h	5
Split Piso-Teto 48.000Btu/h	123
Split Piso-Teto 60.000Btu/h	148
Split Cassete 18.000Btu/h	110
Split Cassete 24.000Btu/h	61
Split Cassete 30.000Btu/h	55
Split Cassete 36.000Btu/h	63
Split Cassete 48.000Btu/h	95
Split Cassete 60.000Btu/h	15
Split Built-in 30.000Btu/h	1
Split Built-in 48.000Btu/h	3
Split Built-in 60.000Btu/h	2
Janeleiro 2.500Btu/h	2
Janeleiro 7.500Btu/h	5
Janeleiro 10.000Btu/h	10
Janeleiro 12.000Btu/h	134
Janeleiro 15.000Btu/h	4
Janeleiro 18.000Btu/h	126
Janeleiro 19.000Btu/h	135
Janeleiro 20.000Btu/h	1
Janeleiro 21.000Btu/h	191
Janeleiro 30.000Btu/h	74
Cortina de Ar	36
Caixas de Ventilação Mecânicas	15

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
 Curitiba – anexo
 Curitiba – centro judiciário
 Curitiba – champagnat
 Curitiba – mauá
 Curitiba – palácio da justiça
 Curitiba – pinheirinho
 Curitiba – restaurante
 Curitiba – tribunal do júri
 Campo largo
 Guaratuba
 Guarapuava
 Rio negro
 Lapa
 Laranjeiras do sul
 Cascavel
 Coronel vivida
 Formosa do oeste
 Foz do iguaçu
 Pato branco
 Toledo
 Cambé
 Engenheiro beltrão
 Jacarezinho

Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.
Londrina.
Guarapuava.

8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

REGIONAL RMC E LITORAL

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,

Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,
Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

REGIONAL DE CASCAVEL

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Ampére
Barracão
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos
Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra

Santo antônio do sudoeste
São João

REGIONAL DE LONDRINA

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia
São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.

8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes)

Unidade	Sede	Regional
Curitiba	Augusto Severo	I
Curitiba	Palácio da Justiça	I
Curitiba	Mauá	I
Curitiba	Centro Judiciário Ahú	I
Curitiba	Barracão	I
Ponta Grossa (Ponta Grossa)	Fórum da Comarca de Ponta Grossa	II
Ponta Grossa (União da Vitória)	Fórum da Família e da Infância e Juventude	II
Guarapuava (Guarapuava)	Comarca de Guarapuava	III
Guarapuava (Guarapuava)	Comarca de Guarapuava	III
Francisco Beltrão (Pato Branco)	Comarca de Pato Branco	IV
Francisco Beltrão (Pato Branco)	Comarca de Pato Branco	IV
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Cascavel (Foz do Iguaçu)	Comarca de Foz do Iguaçu	V
Cascavel (Cascavel)	Comarca de Cascavel	V
Cascavel (Cascavel)	Comarca de Cascavel	V
Campo Mourão (Campo Mourão)	Comarca de Campo Mourão	VI
Umuarama (Cruzeiro do Oeste)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Umuarama (Cruzeiro do Oeste)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII
Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII

Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII
Santo Antônio da Platina	Comarca de Ribeirão Claro	X
Santo Antônio da Platina	Comarca de Cornélio Procópio	X
Telêmaco Borba	Comarca de Telêmaco Borba	XI

Comarcas atendidas por Regional (Sede)

REGIONAL CURITIBA	UNIDADE
ALMIRANTE TAMANDARÉ	Fórum local
ANTONINA	Fórum local
ARAUCÁRIA	Fórum local
BOCAIÚVA DO SUL	Fórum local
CAMPINA GRANDE DO SUL	Fórum local
CAMPO LARGO	Fórum local
CERRO AZUL	Fórum local
COLOMBO	Fórum Central
COLOMBO	Juizados Especiais
COLOMBO	Arquivos gerais
COLOMBO	Fórum Cível
COLOMBO	Fórum da Família
COLOMBO	Arquivos
CURITIBA	Sede Álvaro Ramos
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 1
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 2
CURITIBA	Barracão Anita Garibaldi
CURITIBA	Sede Arquivo Pinhais
CURITIBA	Sede Arquivo São José dos
CURITIBA	Barracão Flávio Dallegrove
CURITIBA	Sede Lysimaco Ferreira da
CURITIBA	Centro de Educação Infantil
CURITIBA	Cetrans
CURITIBA	Cetrans - DETO
CURITIBA	Centro Judiciário de Curitiba
CURITIBA	Sede Cândido de Abreu
CURITIBA	Sede Pery Moreira
CURITIBA	Sede Rua da Glória 1
CURITIBA	Sede Rua da Glória 2
CURITIBA	Sede Rua da Glória 3
CURITIBA	Sede Nilo Peçanha
CURITIBA	Sede Ivo Leão
CURITIBA	Escola da Magistratura
CURITIBA	Fórum Cível 1 (Cândido de
CURITIBA	Fórum Cível 2 (Mateus
CURITIBA	Sede Mauá
CURITIBA	Sede Mauá 2 (Augusto
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado de

CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Sede Mateus Leme
CURITIBA	Complexo do Palácio da
CURITIBA	Tribunal do Júri
CURITIBA	Sede Avenida Iguaçu
CURITIBA	Vara de Adolescentes
CURITIBA	Vara de Execuções Penais
FAZENDA RIO GRANDE	Fórum local
FAZENDA RIO GRANDE	Juizados Especiais
GUARATUBA	Fórum local
LAPA	Fórum local
MATINHOS	Fórum local
MORRETES	Fórum local
PARANAGUÁ	Fórum Central
PARANAGUÁ	Fórum Cível
PARANAGUÁ	Juizados Especiais
PARANAGUÁ	Arquivos gerais
PINHAIS	Fórum local
PIRAQUARA	Fórum Central
PIRAQUARA	Fórum Cível e Família
PONTAL DO PARANÁ	Fórum local
RIO BRANCO DO SUL	Fórum local
RIO NEGRO	Fórum local
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum Central
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Família
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Juizados Especiais
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Fazenda Pública

SEDE PONTA GROSSA	UNIDADE
CASTRO	Fórum local
IMBITUVA	Fórum local
IPIRANGA	Fórum local
JAGUARIAÍVA	Fórum local
PALMEIRA	Fórum local
PIRAÍ DO SUL	Fórum local
PONTA GROSSA	Fórum central
PONTA GROSSA	Sede Cejusc e arquivos
SENGÉS	Fórum local

SEDE UNIÃO DA VITÓRIA	UNIDADE
IRATI	Fórum local
IRATI	Juizados Especiais
MALLET	Fórum local
REBOUÇAS	Fórum local
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Fórum local

SÃO MATEUS DO SUL	Fórum local
TEIXEIRA SOARES	Fórum local
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum central
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 1
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 2
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum da Família

SEDE TELÊMACO BORBA	UNIDADE
ARAPOTI	Fórum local
CÂNDIDO DE ABREU	Fórum local
CONGONHINHAS	Fórum local
CURIÚVA	Fórum local
IBAITI	Fórum local
ORTIGUEIRA	Fórum local
RESERVA	Fórum local
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Fórum local
TELÊMACO BORBA	Fórum central
TELÊMACO BORBA	Fórum da Família
TIBAGI	Fórum local

SEDE RIBEIRÃO CLARO	UNIDADE
CARLÓPOLIS	Fórum local
JACAREZINHO	Fórum local
JOAQUIM TÁVORA	Fórum local
RIBEIRÃO CLARO	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Fórum local
SIQUEIRA CAMPOS	Fórum local
TOMAZINA	Fórum local
WENCESLAU BRAZ	Fórum local

SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO	UNIDADE
ANDIRÁ	Fórum local
BANDEIRANTES	Fórum local
CAMBARÁ	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Juizados Especiais
NOVA FÁTIMA	Fórum local
RIBEIRÃO DO PINHAL	Fórum local
SANTA MARIANA	Fórum local

SEDE LONDRINA	UNIDADE
APUCARANA	Fórum local
ARAPONGAS	Fórum local
ASSAÍ	Fórum local
BELA VISTA DO PARAÍSO	Fórum local

CAMBÉ	Fórum local
FAXINAL	Fórum local
GRANDES RIOS	Fórum local
GRANDES RIOS	Arquivos gerais
IBIPORÃ	Fórum local
JAGUAPITÃ	Fórum local
LONDRINA	Fórum local
LONDRINA	Fórum Criminal
MARILÂNDIA DO SUL	Fórum local
PORECATÚ	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Uso geral forense
ROLÂNDIA	Fórum local
SERTANÓPOLIS	Fórum local
URAI	Fórum local

SEDE MARINGÁ	UNIDADE
ALTO PARANÁ	Fórum local
ASTORGA	Fórum local
CENTENÁRIO DO SUL	Fórum local
COLORADO	Fórum local
JANDAIA DO SUL	Fórum local
LOANDA	Fórum local
MANDAGUAÇÚ	Fórum local
MANDAGUARÍ	Fórum local
MARIALVA	Fórum local
MARIALVA	Uso geral forense
MARINGÁ	Fórum local
MARINGÁ	Arquivos gerais
MARINGÁ	Arquivos
MARINGÁ	Fórum Cível
MARINGÁ	Juizados Especiais
NOVA ESPERANÇA	Fórum local
NOVA LONDRINA	Fórum local
PARANACITY	Fórum local
PARANAVAÍ	Fórum local
SANTA FÉ	Fórum local
SARANDI	Fórum local
TERRA RICA	Fórum local

SEDE CRUZEIRO DO OESTE	UNIDADE
ALTO PIQUIRI	Fórum local
ALTÔNIA	Fórum local
ASSIS CHATEAUBRIAND	Fórum local
CIDADE GAÚCHA	Fórum local

CRUZEIRO DO OESTE	Fórum local
FORMOSA DO OESTE	Fórum local
GOIOERÊ	Fórum local
GUAÍRA	Fórum local
ICARAÍMA	Fórum local
IPORÃ	Fórum local
PALOTINA	Fórum local
PARAÍSO DO NORTE	Fórum local
PÉROLA	Fórum local
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Fórum local
TERRA ROXA	Fórum local
UMUARAMA	Fórum local
XAMBRÊ	Fórum local

SEDE CAMPO MOURÃO	UNIDADE
BARBOSA FERRAZ	Fórum local
CAMPINA DA LAGOA	Fórum local
CAMPO MOURÃO	Fórum local
CIANORTE	Fórum local
CIANORTE	Juizados Especiais
ENGENHEIRO BELTRÃO	Fórum local
IRETAMA	Fórum local
IVAIPORÃ	Fórum local
MAMBORÊ	Fórum local
PEABIRÚ	Fórum local
SÃO JOÃO DO IVAÍ	Fórum local
TERRA BOA	Fórum local
UBIRATÃ	Fórum local

SEDE CASCAVEL	UNIDADE
CAPANEMA	Fórum local
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Fórum local
CASCAVEL	Fórum local
CATANDUVAS	Fórum local
CORBÉLIA	Fórum local
GUARANIAÇÚ	Fórum local
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Fórum local
MATELÂNDIA	Fórum local
NOVA AURORA	Fórum local
QUEDAS DO IGUAÇÚ	Fórum local
SANTA HELENA	Fórum local
TOLEDO	Fórum local

SEDE FOZ DO IGUAÇU	UNIDADE
FOZ DO IGUAÇU	Fórum local

MEDIANEIRA	Fórum local
SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	Fórum local

SEDE PATO BRANCO	UNIDADE
AMPÉRE	Fórum local
BARRAÇÃO	Fórum local
CHOPINZINHO	Fórum local
CLEVELÂNDIA	Fórum local
CORONEL VIVIDA	Fórum local
DOIS VIZINHOS	Fórum local
FRANCISCO BELTRÃO	Fórum local
MANGUEIRINHA	Fórum local
MARMELEIRO	Fórum local
PALMAS	Fórum local
PATO BRANCO	Fórum local
REALEZA	Fórum local
SALTO DO LONTRA	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	Fórum local
SÃO JOÃO	Fórum local

SEDE GUARAPUAVA	UNIDADE
CANTAGALO	Fórum local
GUARAPUAVA	Fórum local
LARANJEIRAS DO SUL	Fórum local
MANOEL RIBAS	Fórum local
PALMITAL	Fórum local
PINHÃO	Fórum local
PITANGA	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Arquivos gerais
